


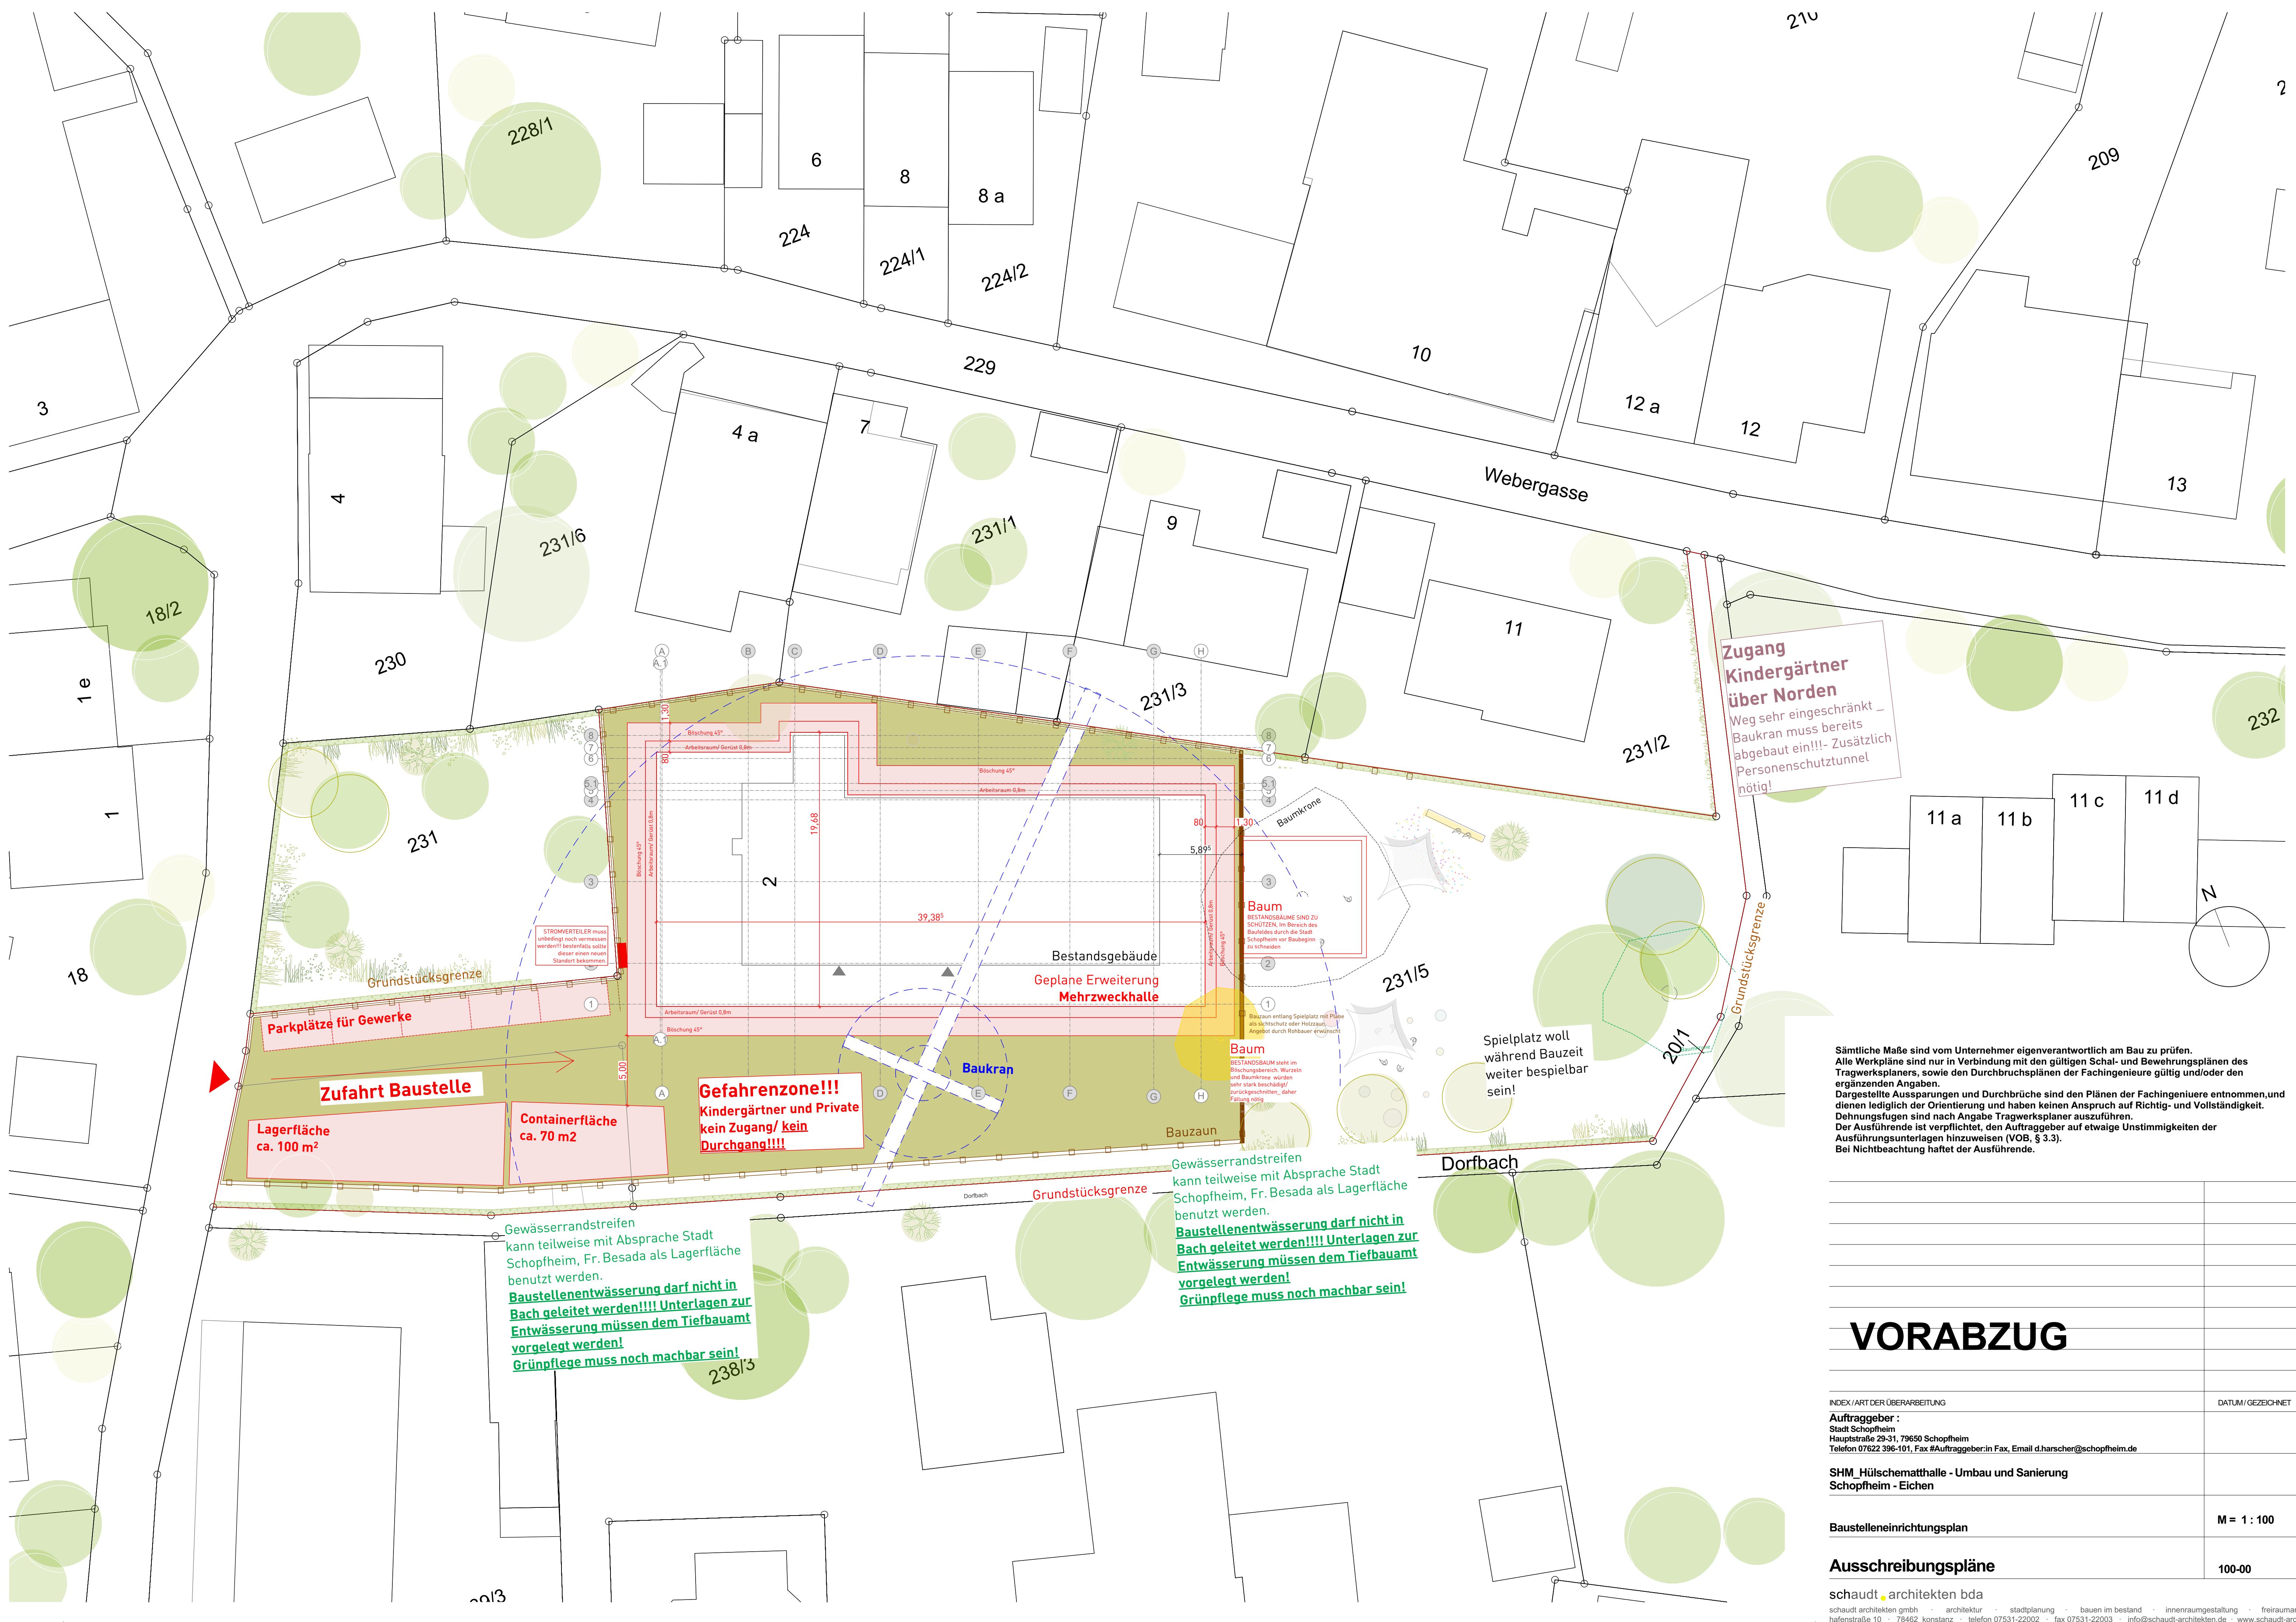

Zugang Kindergärtner über Norden
Weg sehr eingeschränkt - Baukran muss bereits abgebaut sein!!! - Zusätzlich Personenschutz-tunnel nötig!

STROMVERTEILER muss unbedingt noch vermessen werden!!! Besondere sollte dieser einen neuen Standort bekommen.

Baum
BESTANDSBÄUME SIND ZU SCHÜTZEN. Im Bereich des Baufeldes durch die Stadt Schopfheim vor Baubeginn zu schneiden.

Baum
BESTANDSBÄUME sind im Bereich des Baufeldes durch die Stadt Schopfheim vor Baubeginn zu schneiden.

Gewässerrandstreifen kann teilweise mit Absprache Stadt Schopfheim, Fr. Besada als Lagerfläche benutzt werden.
Baustellenentwässerung darf nicht in Bach geleitet werden!!!! Unterlagen zur Entwässerung müssen dem Tiefbauamt vorgelegt werden!
Grünpflege muss noch machbar sein!

Gewässerrandstreifen kann teilweise mit Absprache Stadt Schopfheim, Fr. Besada als Lagerfläche benutzt werden.
Baustellenentwässerung darf nicht in Bach geleitet werden!!!! Unterlagen zur Entwässerung müssen dem Tiefbauamt vorgelegt werden!
Grünpflege muss noch machbar sein!

Spielplatz woll während Bauzeit weiter beispielbar sein!

VORABZUG

INDEX / ART DER ÜBERARBEITUNG	DATUM / GEZEICHNET
Auftraggeber : Stadt Schopfheim Hauptstraße 29-31, 79650 Schopfheim Telefon 07622 396-101, Fax #Auftraggeber:in Fax, Email d.harscher@schopfheim.de	
SHM_Hülschematthalle - Umbau und Sanierung Schopfheim - Eichen	
Baustelleneinrichtungsplan	M = 1 : 100
Ausschreibungspläne	100-00
