Neubau Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik - ZfP Weissenau

Projektnummer: W24125

Bauzeitenplan

Stand: 03.11.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**LPH 8 BAUAUSFÜHRUNG**	**956kt**	**Mo, 29.09.25**	**Do, 11.05.28**
1.1	**Baubeginn**	**1at**	**Mo, 29.09.25**	**Mo, 29.09.25**
1.2	**ROHBAUGEWERKE**	**740kt**	**Mo, 29.09.25**	**Fr, 08.10.27**
1.2.1	**ROHBAUARBEITEN**	**307wt**	**Mo, 29.09.25**	**Sa, 17.10.26**
1.2.2	**BLITZSCHUTZARBEITEN**	**446at**	**Fr, 31.10.25**	**Mi, 01.09.27**
1.2.1	Ringerder EG	10at	Fr, 31.10.25	Do, 13.11.25
1.2.2	Fundamenterder EG	27at	Fr, 14.11.25	Mi, 07.01.26
1.2.3	Bitzschutz Dacheinbauen	15at	Do, 15.07.27	Mi, 04.08.27
1.2.4	Blitzschutz Fassade einbauen	10at	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.5	Fertigstellung Blitzschutz	10at	Mi, 18.08.27	Di, 31.08.27
1.2.6	Freimessung Blitzschutz	1at	Mi, 01.09.27	Mi, 01.09.27
1.2.3	**GERÜSTBAUARBEITEN**	**180at**	**Mo, 11.01.27**	**Fr, 24.09.27**
1.2.3.1	Gerüstbauarbeiten	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.2.3.2	Gerüst Standzeit	160at	Fr, 15.01.27	Do, 02.09.27
1.2.3.3	Gerüst Abbau	10at	Mo, 13.09.27	Fr, 24.09.27
1.2.4	**DACHDECKUNGS- UND ABDICHTUNGS-, SPENGLERARBEITEN**	**460kt**	**Mo, 06.07.26**	**Fr, 08.10.27**
1.2.4.1	Grundkörper Dacheinläufe liefern, montieren für Betonage durch Gewerk Rohbau	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
1.2.4.2	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung Innenhöfe vor Gerüstbauarbeiten	5at	Mo, 21.12.26	Fr, 08.01.27
1.2.4.3	Bestellung, Lieferzeit Einbauten	85kt	So, 01.11.26	So, 24.01.27
1.2.4.4	Oberlichter, Dachausstiege, RWA sukzessive Dampfsperre	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.2.4.5	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung	15at	Mo, 25.01.27	Fr, 12.02.27
1.2.4.6	Dämmung	20at	Mo, 15.02.27	Fr, 12.03.27
1.2.4.7	Dachabdichtungsarbeiten Oberlage	20at	Mo, 01.03.27	Di, 30.03.27
1.2.4.8	Abdichtungsarbeiten Innenhöfe	10at	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
1.2.4.9	Dachbegrünung	15at	Mi, 30.06.27	Di, 20.07.27
1.2.5	**FENSTER UND AUSSENTÜREN**	**178at**	**Mo, 01.06.26**	**Do, 18.02.27**
1.2.5.1	Werk- und Montageplanung	40at	Mo, 01.06.26	Mo, 27.07.26
1.2.5.2	Prüfung und Freigabe W+M Planung	10at	Di, 28.07.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.3	Freigabe Musterfenster	1at	Mo, 10.08.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.4	Produktion Fenster + Außentüren + PR Fassade geschossweise	80at	Di, 11.08.26	Mo, 30.11.26
1.2.5.5	EG: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 28.07.26	Mo, 03.08.26
1.2.5.6	EG: Fenster + Außentüren + PR Fassade Einbau	15at	Di, 01.12.26	Mo, 21.12.26
1.2.5.7	OG 1: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 04.08.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.8	OG 1: Fenster + PR Fassade Einbau	15at	Fr, 08.01.27	Do, 28.01.27
1.2.5.9	OG 2: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26
1.2.5.10	OG 2: Fenster + PR Fassade Einbau	15at	Fr, 29.01.27	Do, 18.02.27
1.2.5.11	**Gebäude DICHT UND TROCKEN**	1at	Do, 18.02.27	Do, 18.02.27
1.2.6	**SONNENSCHUTZ**	**25at**	**Fr, 19.02.27**	**Do, 25.03.27**
1.2.6.1	Einbau Sonnenschutz	25at	Fr, 19.02.27	Do, 25.03.27
1.2.7	**VORGEHÄNGTE HINTERL. FASSADE**	**135at**	**Fr, 19.02.27**	**Do, 02.09.27**
1.2.7.1	BFT Eingang	10at	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.7.2	Vormauerung Klinker	105at	Fr, 05.03.27	Do, 05.08.27
1.2.7.3	Attika BFT	15at	Fr, 16.07.27	Do, 05.08.27
1.2.7.4	Fensterbank BFT	20at	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27
1.2.8	**AUFZÜGE**	**310at**	**Di, 07.04.26**	**Fr, 09.07.27**
1.2.8.1	Abstimmung mit Rohbau / Einbauteile liefern	10at	Di, 07.04.26	Mo, 20.04.26
1.2.8.2	Einbau / Fertigmontage	20at	Mo, 14.06.27	Fr, 09.07.27
1.3	**AUSBAUGEWERKE KG300**	**509kt**	**Mo, 26.10.26**	**Fr, 17.03.28**
1.3.1	**SCHREINERARBEITEN - INNENTÜREN**	**286at**	**Mo, 02.11.26**	**Di, 11.01.28**
1.3.1.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.1.2	Montagezargen	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.1.3	Blockzargen	25at	Mi, 03.11.27	Di, 07.12.27
1.3.1.4	Holztürblätter, Schiebetüren	15at	Mi, 08.12.27	Di, 11.01.28
1.3.2	**METALLBAUARBEITEN - INNENTÜREN**	**286at**	**Mo, 02.11.26**	**Di, 11.01.28**
1.3.2.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.2.2	Montagezargen	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.2.3	Zargen	25at	Mi, 03.11.27	Di, 07.12.27
1.3.2.4	Stahlblechtüren, JVA Türen	15at	Mi, 08.12.27	Di, 11.01.28
1.3.3	**STAHLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN**	**169at**	**Mo, 02.11.26**	**Do, 15.07.27**
1.3.3.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.3.2	Geländer Innentreppen	30at	Fr, 04.06.27	Do, 15.07.27
1.3.4	**PUTZ- UND STUCKARBEITEN**	**236at**	**Mo, 11.01.27**	**Di, 14.12.27**
1.3.4.1	Innenputz EG beginnend an Massivwänden ohne Trockenbau	20at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27
1.3.4.2	Innenputz OG 1	20at	Do, 04.02.27	Mi, 03.03.27
1.3.4.3	Innenputz OG 2	20at	Di, 02.03.27	Mi, 31.03.27
1.3.4.4	Beiputzarbeiten (Türen, etc.)	5at	Mi, 08.12.27	Di, 14.12.27
1.3.5	**TROCKENBAU**	**211at**	**Mo, 26.10.26**	**Mo, 06.09.27**
1.3.5.1	Boden- und Deckenschienen EG	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
1.3.5.2	UK Wände u. einseitig beplanken EG	12at	Mo, 16.11.26	Di, 01.12.26
1.3.5.3	Boden- und Deckenschienen OG 1	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
1.3.5.4	UK Wände + einseitig beplanken OG 1	8at	Mi, 02.12.26	Fr, 11.12.26
1.3.5.5	Boden- und Deckenschienen OG 2	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
1.3.5.6	UK Wände + einseitig beplanken OG 2	8at	Mo, 14.12.26	Mi, 23.12.26
1.3.5.7	(Eventuell) Estrich / Putzabstellungen Wände	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.5.8	Freigabe Schließen der Wände durch TGA	1at	Mi, 03.02.27	Mi, 03.02.27
1.3.5.9	Wände schließen Geschossweise	25at	Mi, 03.02.27	Di, 09.03.27
1.3.5.10	EG UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Fr, 30.04.27	Mo, 24.05.27
1.3.5.11	OG 1 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Fr, 21.05.27	Fr, 11.06.27
1.3.5.12	OG 2 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Do, 10.06.27	Mi, 30.06.27
1.3.5.13	Freigabe Schließen der Decken	1at	Mo, 12.07.27	Mo, 12.07.27
1.3.5.14	**UK ergänzen + Schließen Decken GK**	**40at**	**Di, 13.07.27**	**Mo, 06.09.27**
1.3.5.14.1	EG	10at	Di, 13.07.27	Mo, 26.07.27
1.3.5.14.2	OG1	15at	Di, 27.07.27	Mo, 16.08.27
1.3.5.14.3	OG2	15at	Di, 17.08.27	Mo, 06.09.27
1.3.6	**SCHREINER - Akustikdecken- und Wände (MZH)**	**134at**	**Mo, 10.05.27**	**Di, 16.11.27**
1.3.6.1	Unterkonstruktion setzen	30at	Mo, 10.05.27	Di, 22.06.27
1.3.6.2	Freigabe Schließen der Decken / Wände	1at	Di, 20.07.27	Di, 20.07.27
1.3.6.3	Decken schließen	25at	Di, 20.07.27	Mo, 23.08.27
1.3.6.4	Sporthallentüren, Verkleidung Prallwände	20at	Di, 19.10.27	Di, 16.11.27
1.3.7	**ESTRICHARBEITEN**	**91kt**	**Mo, 15.03.27**	**So, 13.06.27**
1.3.7.1	Dämmungen EG	7at	Mo, 15.03.27	Di, 23.03.27
1.3.7.2	FBH EG	10at	Mi, 24.03.27	Do, 08.04.27
1.3.7.3	Estrich EG	10at	Fr, 09.04.27	Do, 22.04.27
1.3.7.4	Dämmungen OG1	7at	Mi, 24.03.27	Mo, 05.04.27
1.3.7.5	FBH OG1	10at	Fr, 09.04.27	Do, 22.04.27
1.3.7.6	Estrich OG 1	10at	Fr, 23.04.27	Fr, 07.05.27
1.3.7.7	Dämmungen OG2	7at	Di, 06.04.27	Mi, 14.04.27
1.3.7.8	FBH OG2	10at	Fr, 23.04.27	Fr, 07.05.27
1.3.7.9	Estrich OG 2	10at	Mo, 10.05.27	Mo, 24.05.27
1.3.7.10	Estrich Trocknungszeit (Annahme mit Beschleuniger 20 KT)	20kt	Di, 25.05.27	So, 13.06.27
1.3.8	**TERRAZZO IN GEWERK ESTRICHARBEITEN**	**115at**	**Mo, 14.06.27**	**Mo, 22.11.27**
1.3.8.1	EG Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
1.3.8.2	OG1 Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Do, 01.07.27	Mi, 21.07.27
1.3.8.3	OG2 Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Di, 20.07.27	Mo, 09.08.27
1.3.8.4	Terrazzo schleifen EG	10at	Di, 27.07.27	Mo, 09.08.27
1.3.8.5	Terrazzo schleifen OG1	10at	Di, 10.08.27	Mo, 23.08.27
1.3.8.6	Terrazzo schleifen OG2	10at	Di, 24.08.27	Mo, 06.09.27
1.3.8.7	Fertigteile Treppen TRH 1	15at	Di, 07.09.27	Mo, 27.09.27
1.3.8.8	Fertigteile Treppen TRH 2	15at	Fr, 24.09.27	Do, 14.10.27
1.3.8.9	Fertigteile Treppen TRH 3	15at	Mi, 13.10.27	Mi, 03.11.27

Erstellt mit Plan One 2026 (pl-one.com) - Lizenz für: ZfP Südwürttemberg, Klinik für Allgemeinpsychiatrie Forensische Klinik

Bearbeiter: p.bodenmueller
Datei: W24125_TP_aktuell_Bauzeitenplan.PPL

Feiertag | Infotag

Dieser Terminplan gilt vorbehaltlich Witterungs- und Störungsrisiken, sowie sonstigen äußeren Einflüssen

2XM baumanagement
ARGE Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik
Reutlinger Straße 44 | 88212 Ravensburg
T +49 751 / 369 87 - 0 | F +49 751 / 369 87 - 99
E info@2xm.de | www.2xm.de


Neubau Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik - ZfP Weissenau

Projektnummer: W24125

Bauzeitenplan

Stand: 03.11.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.3.8.10	Fertigteile Treppen TRH 4	15at	Di, 02.11.27	Mo, 22.11.27
1.3.9	**FLIESEN UND PLATTENARBEITEN**	**65at**	**Di, 10.08.27**	**Di, 09.11.27**
1.3.9.1	Abdichtungsarbeiten EG	5at	Di, 10.08.27	Mo, 16.08.27
1.3.9.2	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27
1.3.9.3	Abdichtungsarbeiten OG1	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27
1.3.9.4	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	25at	Di, 31.08.27	Mo, 04.10.27
1.3.9.5	Abdichtungsarbeiten OG2	10at	Di, 31.08.27	Mo, 13.09.27
1.3.9.6	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	25at	Di, 05.10.27	Di, 09.11.27
1.3.10	**BODENBELAGSARBEITEN-LINO / KAUTSCHUK**	**45at**	**Di, 31.08.27**	**Di, 02.11.27**
1.3.10.1	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	15at	Di, 31.08.27	Mo, 20.09.27
1.3.10.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	15at	Di, 21.09.27	Mo, 11.10.27
1.3.10.3	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	15at	Di, 12.10.27	Di, 02.11.27
1.3.11	**EPOXIDHARZBESCHICHTUNG**	**15at**	**Mi, 03.11.27**	**Di, 23.11.27**
1.3.11.1	Beschichtung Wand	10at	Mi, 03.11.27	Di, 16.11.27
1.3.11.2	Beschichtung Boden	5at	Mi, 17.11.27	Di, 23.11.27
1.3.12	**SPORTBODEN**	**91at**	**Mo, 14.06.27**	**Mo, 18.10.27**
1.3.12.1	Außmaß Freigabe	20at	Mo, 14.06.27	Fr, 09.07.27
1.3.12.2	Einbau Sportboden	15at	Di, 21.09.27	Mo, 11.10.27
1.3.12.3	Linierung	5at	Di, 12.10.27	Mo, 18.10.27
1.3.13	**SPORTGERÄTE**	**152at**	**Di, 20.04.27**	**Di, 23.11.27**
1.3.13.1	Bodenhülsen	5at	Di, 27.04.27	Mo, 03.05.27
1.3.13.2	Vormontage Sportgeräte	5at	Di, 20.04.27	Mo, 26.04.27
1.3.13.3	Endmontage Sportgeräte	5at	Mi, 17.11.27	Di, 23.11.27
1.3.14	**MALER- UND TAPEZIERARBEITEN**	**85at**	**Di, 12.10.27**	**Di, 22.02.28**
1.3.14.1	Malerarbeiten Decke	35at	Di, 12.10.27	Di, 30.11.27
1.3.14.2	Malerarbeiten Wände	40at	Mi, 17.11.27	Di, 25.01.28
1.3.14.3	Restarbeiten & Ausbesserungen	20at	Mi, 26.01.28	Di, 22.02.28
1.3.15	**SCHREINERARBEITEN EINBAUMÖBEL**	**120at**	**Fr, 17.09.27**	**Fr, 17.03.28**
1.3.15.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30at	Fr, 17.09.27	Do, 28.10.27
1.3.15.2	Übergabe Werkstattzeichnung	1at	Fr, 29.10.27	Fr, 29.10.27
1.3.15.3	Prüfung Werkstattzeichnung	10at	Fr, 29.10.27	Fr, 12.11.27
1.3.15.4	Produktion	30at	Mo, 15.11.27	Fr, 07.01.28
1.3.15.5	Einbau Festeinbauten	50at	Mo, 10.01.28	Fr, 17.03.28
1.3.16	**WC TRENNWÄNDE**	**40at**	**Di, 31.08.27**	**Mo, 25.10.27**
1.3.16.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30at	Di, 31.08.27	Mo, 11.10.27
1.3.16.2	Einbau WC Trennwände	10at	Di, 12.10.27	Mo, 25.10.27
1.3.17	**SCHLIEßANLAGE**	**55at**	**Di, 26.10.27**	**Di, 25.01.28**
1.3.17.1	Planung und Abstimmung	45at	Di, 26.10.27	Di, 11.01.28
1.3.17.2	Einbau Schließanlage	10at	Mi, 12.01.28	Di, 25.01.28
1.3.18	**BESCHILDERUNG**	**10at**	**Mi, 12.01.28**	**Di, 25.01.28**
1.3.18.1	Einbau Beschilderung	10at	Mi, 12.01.28	Di, 25.01.28
1.3.19	**GEBÄUDEREINIGUNG**	**57at**	**Mo, 06.12.27**	**Di, 07.03.28**
1.3.19.1	Gebäudereinigung Zwischenreinigung	10at	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27
1.3.19.2	Gebäudereinigung Feinreinigung	15at	Mi, 16.02.28	Di, 07.03.28
1.4	**TECHNISCHE AUSBAUGEWERKE KG400**	**585at**	**Mi, 10.12.25**	**Do, 11.05.28**
1.4.1	**HEIZUNG**	**430at**	**Mo, 06.07.26**	**Mo, 03.04.28**
1.4.1.1	Rohinstallation Heizung	97at	Mo, 06.07.26	Di, 17.11.26
1.4.1.2	EG Rohinstallation Technikraum	50at	Mo, 06.07.26	Fr, 11.09.26
1.4.1.3	EG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 02.11.26	Fr, 18.12.26
1.4.1.4	1.OG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 21.12.26	Fr, 19.02.27
1.4.1.5	2.OG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 22.02.27	Di, 13.04.27
1.4.1.6	Fertiginstallation Heizung	60at	Mo, 25.10.27	Mo, 31.01.28
1.4.1.7	Inbetriebnahme	25at	Di, 01.02.28	Mo, 06.03.28
1.4.1.8	Probebetrieb	20at	Di, 07.03.28	Mo, 03.04.28
1.4.2	**SANITÄR**	**375at**	**Mo, 21.09.26**	**Mo, 03.04.28**
1.4.2.1	Rohinstallation Sanitär	125at	Mo, 21.09.26	Di, 30.03.27
1.4.2.2	EG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 02.11.26	Fr, 15.01.27
1.4.2.3	1.OG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 18.01.27	Fr, 19.03.27
1.4.2.4	2.OG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 22.03.27	Fr, 28.05.27
1.4.2.5	Fertiginstallation Sanitär	60at	Mo, 25.10.27	Mo, 31.01.28
1.4.2.6	Inbetriebnahme	25at	Di, 01.02.28	Mo, 06.03.28
1.4.2.7	Probebetrieb	20at	Di, 07.03.28	Mo, 03.04.28
1.4.3	**LÜFTUNG**	**425at**	**Mo, 06.07.26**	**Mo, 27.03.28**
1.4.3.1	Rohinstallation Lüftung	112at	Mo, 06.07.26	Di, 08.12.26
1.4.3.2	EG Rohinstallation Lüftung	37at	Mo, 02.11.26	Di, 22.12.26
1.4.3.3	1.OG Rohinstallation Lüftung	37at	Mi, 23.12.26	Do, 25.02.27
1.4.3.4	2.OG Rohinstallation Lüftung	38at	Fr, 26.02.27	Do, 22.04.27
1.4.3.5	Fertiginstallation Lüftung	55at	Mo, 25.10.27	Mo, 24.01.28
1.4.3.6	Inbetriebnahme	25at	Di, 25.01.28	Mo, 28.02.28
1.4.3.7	Probebetrieb	20at	Di, 29.02.28	Mo, 27.03.28
1.4.4	**MSR**	**370at**	**Mo, 21.09.26**	**Mo, 27.03.28**
1.4.4.1	Rohinstallation MSR	67at	Mo, 21.09.26	Di, 22.12.26
1.4.4.2	Fertiginstallation MSR	55at	Mo, 25.10.27	Mo, 24.01.28
1.4.4.3	Inbetriebnahme MSR	25at	Di, 25.01.28	Mo, 28.02.28
1.4.4.4	Probebetrieb MSR	20at	Di, 29.02.28	Mo, 27.03.28
1.4.5	**PV-ANLAGE**	**50at**	**Mi, 09.06.27**	**Di, 17.08.27**
1.4.5.1	UK PV	30at	Mi, 09.06.27	Di, 20.07.27
1.4.5.2	PV Module	20at	Mi, 21.07.27	Di, 17.08.27
1.4.6	**ELEKTRO**	**565at**	**Mi, 10.12.25**	**Mo, 10.04.28**
1.4.6.1	Einlegearbeiten Decke und Wände EG	58at	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.4.6.2	Einlegearbeiten Decke und Wände 1.OG	58at	Mo, 16.03.26	Do, 11.06.26
1.4.6.3	Einlegearbeiten Decke und Wände 2.OG	58at	Mi, 10.06.26	Fr, 28.08.26
1.4.6.4	Vorinstallation Trassen EG	18at	Mi, 24.06.26	Fr, 17.07.26
1.4.6.5	Vorinstallation Trassen OG 1	20at	Mo, 20.07.26	Fr, 14.08.26
1.4.6.6	Vorinstallation Trassen OG 2	20at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26
1.4.6.7	Rohinstallation	280at	Mo, 17.08.26	Fr, 01.10.27
1.4.6.8	Fertiginstallation	125at	Mo, 04.10.27	Mo, 10.04.28
1.4.7	**BMA / IBN**	**49at**	**Mi, 01.03.28**	**Do, 11.05.28**
1.4.7.1	Inbetriebnahme ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	25at	Mi, 01.03.28	Di, 04.04.28
1.4.7.2	Probe Betrieb BMA, ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	25at	Mi, 01.03.28	Di, 04.04.28
1.4.7.3	TÜV Abnahme BMA, SiBe, RWA, BOS	1at	Di, 04.04.28	Di, 04.04.28
1.4.7.4	Mängelbehebung BMA, ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	10at	Di, 04.04.28	Mi, 19.04.28
1.4.7.5	Nachprüfung BMA, TÜV Abnahme SiBe, RWA, BOS	5at	Do, 20.04.28	Mi, 26.04.28
1.4.7.6	Mängelbehebung, Nachprüfung, Abnahmen	10at	Do, 27.04.28	Do, 11.05.28

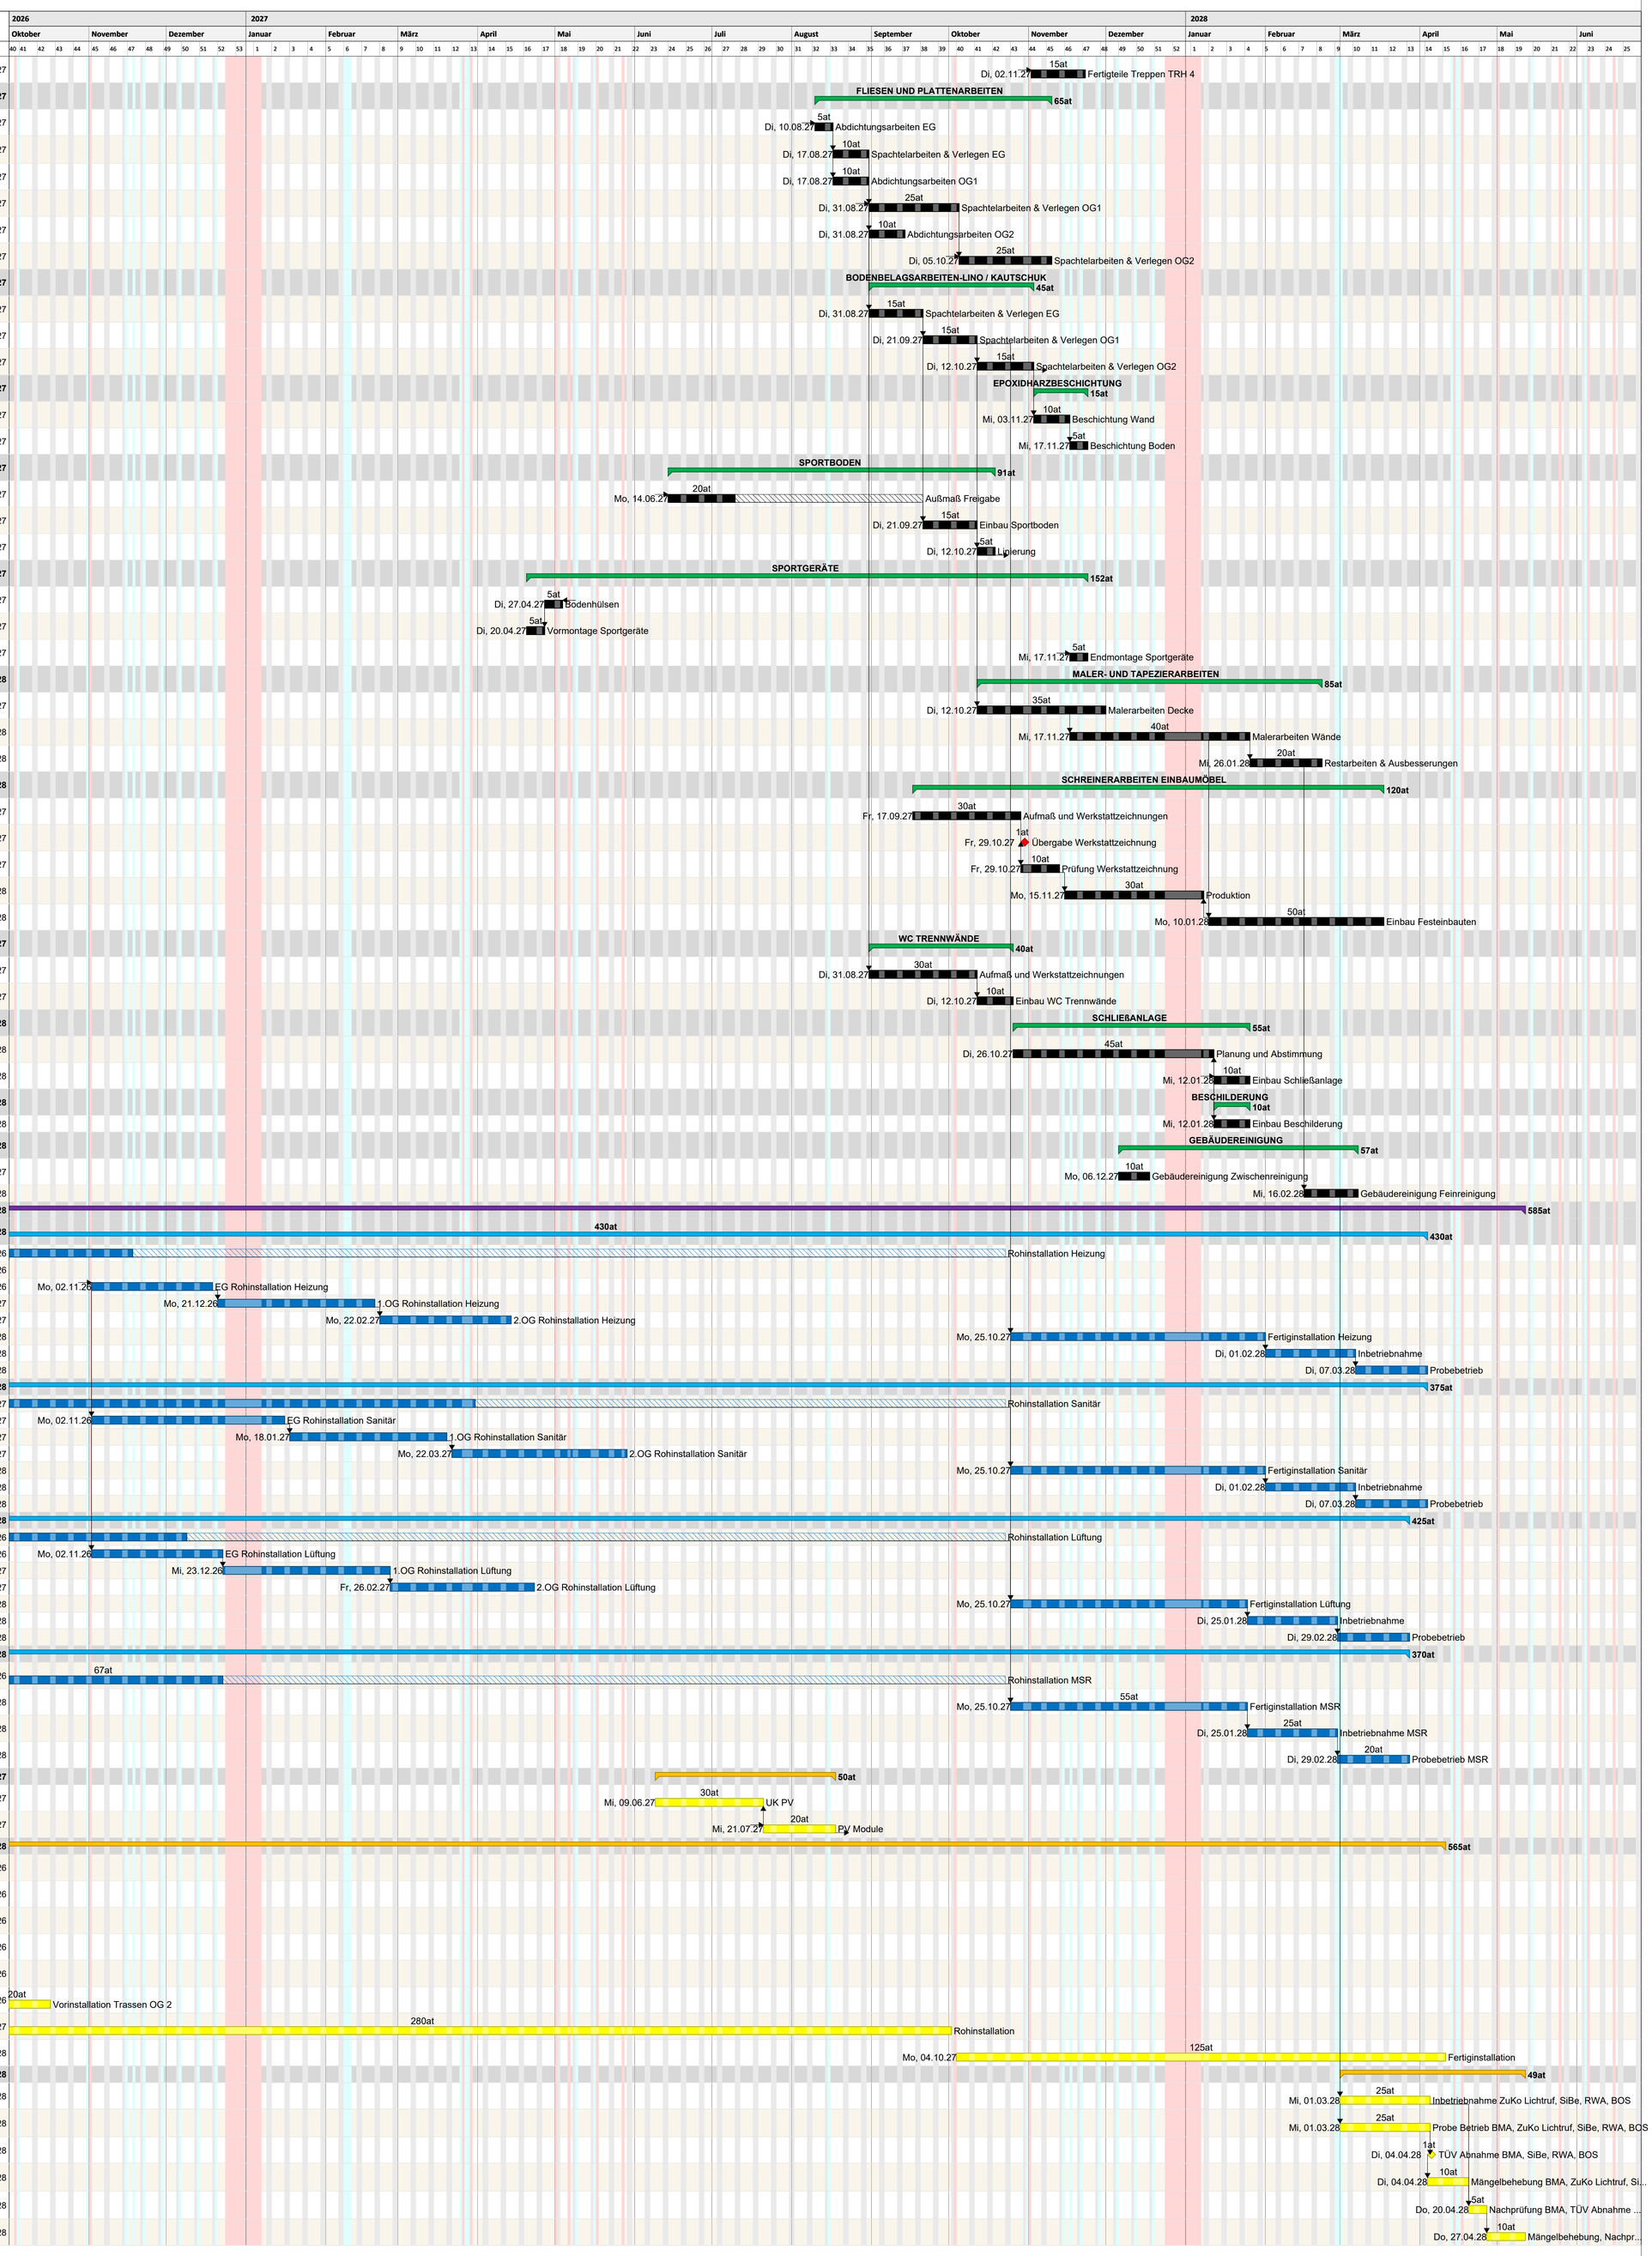

Bearbeiter: p.bodenmueller
Datei: W24125_TP_aktuell_Bauzeitenplan.PPL

Feiertag Infotag

Dieser Terminplan gilt vorbehaltlich Witterungs- und Störungsrisiken, sowie sonstigen äußeren Einflüssen

erstellt mit der 2XM Software Suite (c) 2025 Service by: PKS-CAT/BIDPLACE Users for 2XM Baumanagement GmbH, Kriegerstr. Edgbo
