Universitätsstadt Tübingen
Tiefbauamt

GROBTERMINPLAN
Fußgängersteg über DB beim LRA Tübingen
Stand: Entwurf

Prj. Nr.: 24-203
Ersteller: FH
Datum : 16.07.2026
Index: 01
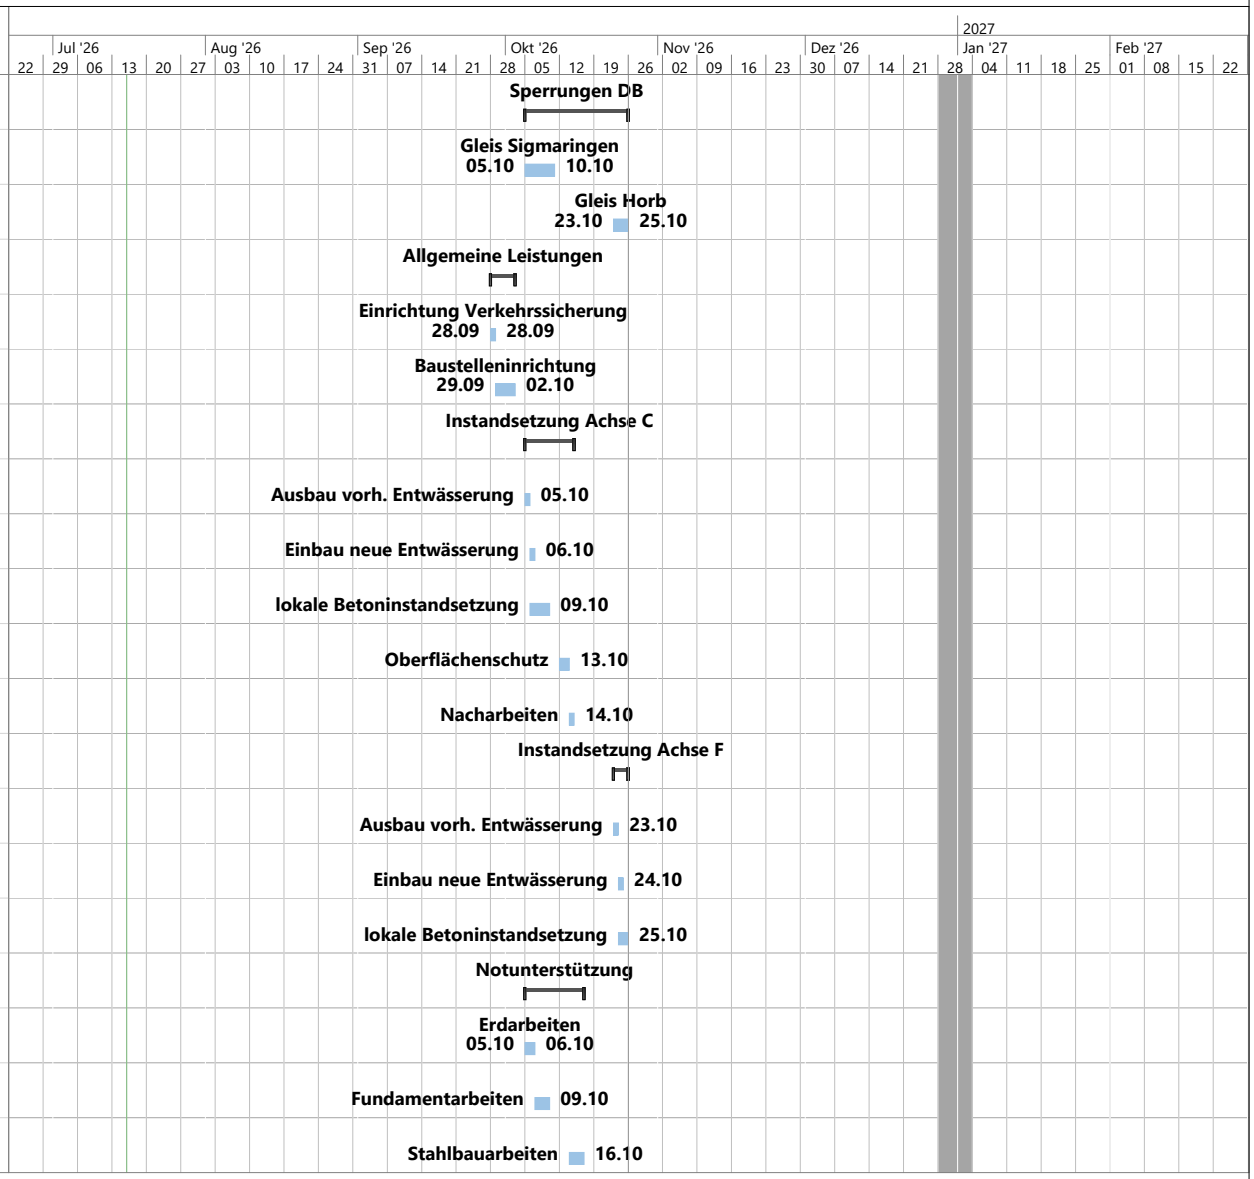
Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Sperrungen DB**	**18 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Son 25.10.26**
2		Gleis Sigmaringen	6 Tage	Mon 05.10.26	Sam 10.10.26
3		Gleis Horb	3 Tage	Fre 23.10.26	Son 25.10.26
4		**Allgemeine Leistungen**	**5 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 02.10.26**
5		Einrichtung Verkehrssicherung	1 Tag	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26
6		Baustelleninrichtung	4 Tage	Die 29.09.26	Fre 02.10.26
7		**Instandsetzung Achse C**	**9 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mit 14.10.26**
8		Ausbau vorh. Entwässerung	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
9		Einbau neue Entwässerung	1 Tag	Die 06.10.26	Die 06.10.26
10		lokale Betoninstandsetzung	4 Tage	Die 06.10.26	Fre 09.10.26
11		Oberflächenschutz	2 Tage	Mon 12.10.26	Die 13.10.26
12		Nacharbeiten	1 Tag	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26
13		**Instandsetzung Achse F**	**3 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Son 25.10.26**
14		Ausbau vorh. Entwässerung	1 Tag	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26
15		Einbau neue Entwässerung	1 Tag	Sam 24.10.26	Sam 24.10.26
16		lokale Betoninstandsetzung	2 Tage	Sam 24.10.26	Son 25.10.26
17		**Notunterstützung**	**11 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 16.10.26**
18		Erdarbeiten	2 Tage	Mon 05.10.26	Die 06.10.26
19		Fundamentarbeiten	3 Tage	Mit 07.10.26	Fre 09.10.26
20		Stahlbauarbeiten	3 Tage	Mit 14.10.26	Fre 16.10.26
